Chantier Mangon – Vérification électricité

Visite du 29/10/2026 · 86 points de contrôle · 14 photos

Chaque point est repris depuis le début : ce qui a été budgété (devis de l'électricien), ce qui a été signé (plans électriques signés) et ce qui a été constaté sur place. La colonne « Lecture » en déduit s'il s'agit d'un manquement, d'un écart au budget ou d'un point à clarifier.

1. Synthèse

Constat du 29/10	Nombre
Absent	5
Non conforme	10
À vérifier	9
Conforme	48
Non vérifié	14
Total	86






Lecture budget / signé / constaté	Nombre	Points
Manquements de l'électricien	13	Point au-dessus de la douche (Salle de douche) · Spots au plafond (Garde-manger) · Interrupteur des spots (Cuisine) · Point lumineux sous meuble (Cuisine) · Appliques extérieures (Buanderie) · Prise extérieure (Buanderie) · Appliques murales, 2 directions (Salon) · Tube LED 1,20 m (Garage) · Prise NIKO Hydro noire (Garage) · Alimentations pompe à chaleur (int. + ext.) et chauffe-eau (Garage) · Applique, 2 directions + témoin (Hall des chambres 3 et 4) · Prises doubles (Chambre 2) · Prises simples (Chambre 3)
Points à clarifier	10	Différentiels (Tableau électrique) · Points lumineux au plafond (Salle de douche) · Prises doubles plan de travail (Cuisine) · Interrupteurs près de la porte du hall (Salle à manger) · Alimentation chaudière (Garage) · Éclairage au plafond (Escalier et hall des chambres 1 et 2) · Point sur rail (Hall des chambres 3 et 4) · Liaison équipotentielle (Salle de bains) · Prises doubles (Chambre 1) · Prises USB A / USB C (Chambre 3)
Écarts au budget (suppléments ou moins-values)	9	Spots au plafond (Hall d'entrée et hall cuisine) · Détecteur (Garde-manger) · Spots au plafond (Cuisine) · Tableau du garage (Garage) · Éclairage extérieur côté jardin (Garage) · Point lumineux (Chambre 4) · Prises doubles (Chambre 4) · Point lumineux + prise (Bureau / dressing (étage)) · Prises doubles (Combles)

Attention : numérotation des chambres

Le devis et les plans ne numérotent pas les chambres de la même façon (le listing du tableau diffère aussi du devis). Dans ce document, la numérotation suit le devis : chambre 1 = 14,12 m² (« Ch 4 » sur les plans), chambre 2 = 16,13 m² (« Ch 3 »), chambre 3 = 16,63 m² (« Ch 2 »), chambre 4 = 11,69 m² (« Ch 1 », absente du devis). La commande de la lampe depuis les têtes de lit et les prises USB sont prévues au devis dans la chambre 3, et non dans la chambre 1. C'est probablement l'origine des remarques « c'était dans la chambre 1 ».

2. Manquements de l'électricien


Prévu au devis et/ou aux plans signés, mais absent ou non conforme sur place.





Pièce	Élément	Budgété (devis)	Signé (plans)	Constaté 29/10	Lecture / action	Photo
Salle de douche	Point au-dessus de la douche	Sur le plan envoyé	Absent des plans signés	À vérifier — « 2 prises électriques. Un interrupteur du mauvais côté ? Les prises s'activent si la lumière est allumée »	Le devis prévoit une prise double indépendante ; sur place, les prises ne fonctionnent que lumière allumée : à recâbler. Le point au-dessus de la douche figure au plan envoyé mais pas aux plans signés. Vérifier le côté de l'interrupteur.	
Garde-manger	Spots au plafond	3	2 (G1)	À vérifier — « Uniquement 2 »	Devis : 3 spots ; plans : 2 ; posés : 2. Il manque 1 spot par rapport au budget (à poser ou à déduire).	
Cuisine	Interrupteur des spots	1 direction, déplacé à la demande d'ISEO	F4, près de la porte du hall	Non conforme — « Mauvais endroit »	Le devis prévoit l'interrupteur déplacé à la demande d'ISEO ; il est au mauvais endroit : à repositionner.	
Cuisine	Point lumineux sous meuble	1	Absent	Absent	Prévu au devis (1), oublié sur les plans, non posé : manquement.	–
Buanderie	Appliques extérieures	2, 1 direction + témoin	2 directions (C4, buanderie + salon), témoin non dessiné	Non conforme	Devis : 1 direction + témoin. Posées en 2 directions (buanderie + salon) sans témoin : témoin manquant.	
Buanderie	Prise extérieure	1 NIKO Hydro noire	C5 « Terrasse »	Non conforme	Devis : NIKO Hydro noire. Non conforme sur place (cf. photo) : couleur / modèle à corriger.	

Pièce	Élément	Budgété (devis)	Signé (plans)	Constaté 29/10	Lecture / action	Photo
Salon	Appliques murales, 2 directions	2	2 (A3), mur ouest	Absent	Prévues au devis (2) et aux plans signés (A3) ; non posées : manquement.	–
Garage	Tube LED 1,20 m	1	V2	Non conforme — « Au plus haut »	Prévu au devis et aux plans ; à fixer au plus haut.	–
Garage	Prise NIKO Hydro noire	1	V1	Non conforme — « Gris »	Devis : NIKO Hydro noire ; posée grise : à remplacer.	–
Garage	Alimentations pompe à chaleur (int. + ext.) et chauffe-eau	3	Absentes	Non conforme	3 alimentations prévues au devis, oubliées sur les plans, non conformes sur place : manquement.	–
Hall des chambres 3 et 4	Applique, 2 directions + témoin	1	F2, témoin non dessiné	Non conforme — « Quid des témoins ? Quid deux directions ? Quid de l'applique ? »	Devis : applique 2 directions + témoin. Témoin absent ; 2 directions et applique à vérifier : manquement.	–
Chambre 2	Prises doubles	3	3 (L5, L3, L4)	À vérifier — « Que 2 prises doubles »	Devis : 3 ; plans : 3 ; 2 constatées : 1 prise double manquante (à confirmer).	–
Chambre 3	Prises simples	3	2 (N4, N5)	Absent	Prévues au devis (3) et aux plans (2) ; absentes : manquement.	–

3. Points à clarifier

Le devis, les plans et le constat ne concordent pas : il faut la réponse de l'électricien.


Pièce	Élément	Budgété (devis)	Signé (plans)	Constaté 29/10	Lecture / action	Photo
Tableau électrique	Différentiels	1 × 300 mA + 3 × 30 mA, tétrapolaires (IV)	300 mA + 2 × 30 mA au hall, 1 × 30 mA au garage, tous bipolaires (2P)	Conforme — « Problème de disjoncteur ? »	Devis : différentiels tétrapolaires ; plans : bipolaires, dont 1 au garage. Disjoncteurs : ni 25 A ni 6 A posés. Faire préciser le « problème de disjoncteur » et justifier l'écart au devis (moins-value ?).	
Salle de douche	Points lumineux au plafond	2	1 (H4)	À vérifier	Devis : 2 points ; plans : 1. Photo prise sans statut : compter les points posés. S'il n'y en a qu'un, il en manque un par rapport au devis.	

Pièce	Élément	Budgété (devis)	Signé (plans)	Constaté 29/10	Lecture / action	Photo
Cuisine	Prises doubles plan de travail	2	2 (J1, K1) ; le plan envoyé en mettait une sous la fenêtre	Conforme — « Il y avait également une prise prévue ici »	2 prises doubles conformes au devis. Le plan envoyé en prévoyait une sous la fenêtre : confirmer si une 3e prise est attendue.	
Salle à manger	Interrupteurs près de la porte du hall	Déplacés à la demande d'ISEO	A3, A4, A5	Conforme — « Attention erreur »	Interrupteurs déplacés à la demande d'ISEO ; une erreur est signalée (photo) : préciser laquelle à l'électricien.	
Garage	Alimentation chaudière	Absente du devis	U1 : hors devis	Non conforme	Absente du devis, ajoutée aux plans (U1, hors devis) ; jugée non conforme : préciser le défaut et qui la prend en charge.	–
Escalier et hall des chambres 1 et 2	Éclairage au plafond	5 points classiques, 3 directions	5 spots (F3) : spots hors devis	Non conforme — « 5 spots, comme on a toujours discuté »	Devis : 5 points classiques en 3 directions ; plans : 5 spots (hors devis). Ce qui était convenu (5 spots) ne correspond pas à ce qui est posé : faire préciser le nombre et le type posés, et le surcoût éventuel des spots.	
Hall des chambres 3 et 4	Point sur rail	1	F2	Non conforme — « Quid des rails ? »	Point sur rail prévu au devis (1) ; rail non installé : préciser qui fournit et pose le rail.	
Salle de bains	Liaison équipotentielle	Prévue	Non dessinée	À vérifier — « ? »	Prévue au devis, non dessinée : demander la preuve (contrôle de l'organisme agréé).	–
Chambre 1	Prises doubles	2	2 (L8, L7)	Conforme — « Gros attention : on souhaitait que les appliques et les interrupteurs à côté du lit puissent éteindre la lampe de la chambre »	Prises conformes. Au devis, la commande depuis les têtes de lit (point 3 directions + appliques) est dans la chambre 3 (16,63 m²), pas en chambre 1 (point 1 direction). Voir la numérotation des chambres.	–

Pièce	Élément	Budgété (devis)	Signé (plans)	Constaté 29/10	Lecture / action	Photo
Chambre 3	Prises USB A / USB C	2	N6, N7	À vérifier — « C'était dans la chambre 1 »	Posées en chambre 3 conformément au devis (N6, N7) ; souhaitées en chambre 1. Voir la numérotation des chambres.	–

4. Écarts au budget (suppléments ou moins-values)

Posé ou demandé hors devis, ou posé en quantité différente du devis.

Pièce	Élément	Budgété (devis)	Signé (plans)	Constaté 29/10	Lecture / action	Photo
Hall d'entrée et hall cuisine	Spots au plafond	8	6 : 3 hall cuisine (A1) + 3 hall d'entrée (A2)	Conforme — « Attention prolongement »	8 spots au devis, 6 aux plans et posés : 2 spots en moins que le budget, moins-value à demander. Vérifier le prolongement (photos).	
Garde-manger	Détecteur	Absent du devis (sur le plan envoyé)	G1, près de la porte : hors devis	Conforme	Détecteur posé alors qu'il est absent du devis : supplément éventuel.	–
Cuisine	Spots au plafond	4	6 (F4)	À vérifier — « 6 spots »	Devis : 4 ; plans : 6 ; posés : 6. Conforme aux plans signés, mais 2 spots au-delà du budget : supplément éventuel.	
Garage	Tableau du garage	Absent du devis	30 mA + 3 disjoncteurs, 40 A / 6 mm² : hors devis	Conforme	Tableau du garage hors devis, posé et conforme : supplément éventuel.	–
Garage	Éclairage extérieur côté jardin	Sur le plan envoyé, pas au devis	Absent	Absent — « De quoi on parle ? »	Figurait sur le plan envoyé mais pas au devis ni aux plans signés : non budgété. À commander en supplément si souhaité.	–
Chambre 4	Point lumineux	Absent du devis	M3 : hors devis	Conforme	Chambre absente du devis : point lumineux posé hors budget, supplément éventuel.	–
Chambre 4	Prises doubles	Absentes du devis	2 (M4, M5) : hors devis	À vérifier — « Il y en a 3 »	Chambre absente du devis : 2 prises aux plans, 3	–

Pièce	Élément	Budgété (devis)	Signé (plans)	Constaté 29/10	Lecture / action	Photo
					posées. Hors budget : supplément éventuel.	
Bureau / dressing (étage)	Point lumineux + prise	Sur le plan envoyé, pas au devis	Absents	Absent	Figurait sur le plan envoyé mais pas au devis : non budgété, non posé.	–
Combles	Prises doubles	Absentes du devis (2 sur le plan envoyé)	Aucune : 2 attentes (M1, M2)	À vérifier — « ? »	Absentes du devis ; seules 2 attentes (M1, M2) prévues aux plans : rien à réclamer, supplément si souhaité.	–

5. Écarts devis / plans constatés conformes sur place

Ces points différaient entre le devis et les plans signés, mais ont été cochés conformes le 29/10. À garder en tête pour le décompte final.

Pièce	Élément	Budgété (devis)	Signé (plans)
Hall d'entrée et hall cuisine	Appliques extérieures de la porte d'entrée	2, 1 direction + témoin	2 (A6), témoin non dessiné
Hall d'entrée et hall cuisine	Interrupteur au pied de l'escalier	3 directions + témoin	F3, témoin non dessiné
Hall des chambres 3 et 4	Prises simples	2	1 (H1)
Salle de bains	Éclairage au plafond	4 points classiques	4 (H2), spots selon Ojea

6. Points non vérifiés le 29/10

Pièce	Élément	Budgété (devis)	Signé (plans)
Tableau électrique	Disjoncteurs	21 × 16/20 A, 1 × 6 A, 2 × IV 25 A	19 au hall + 3 au garage ; ni 25 A ni 6 A
Tableau électrique	Compteur	Non précisé	« 1N400 », câble 4 × 16 mm²
Tableau électrique	Listing du tableau	Plans et listing remis	Numéros des chambres différents du devis
Tableau électrique	Mise à la terre	Sectionneur + 2 piquets	9,6 Ω, sectionneur dans le hall
Tableau électrique	Liaisons équipotentielles	Générales + secondaires (salles d'eau)	Non dessinées
Tableau électrique	Bouton test des différentiels	—	Chacun doit déclencher
Tableau électrique	Finitions NIKO	Gamme non précisée ; supplément Intense blanc à l'étage, anthracite au rez	Couleur posée à relever
Salle de douche	Prise double indépendante	1	H5
Salle de douche	Liaison équipotentielle	Prévue	Non dessinée
Escalier et hall des chambres 1 et 2	Commandes avec témoin	3	3 (F3), témoin non dessiné
Escalier et hall des chambres 1 et 2	Prise simple	1	L1
Bureau / dressing (étage)	Cloison	Sur le plan envoyé	Non dessinée
Combles	Point lumineux, 2 directions	Absent du devis	F1 : hors devis
Combles	Attentes M1 et M2	—	Boîtes à fermer et repérer

7. Points conformes

- **Hall d'entrée et hall cuisine :** Détecteurs encastrés au plafond, Variation des spots, Prises simples, Appliques extérieures de la porte d'entrée, Sonnette, Interrupteur au pied de l'escalier
- **WC :** Point lumineux, 1 direction
- **Bureau (rez) :** Point lumineux, 1 direction, Prises simples, Prise double

- **Garde-manger :** Prise congélateur, Prise simple
- **Cuisine :** Prise frigo, Prise hotte, Prise micro-ondes, Prise four, Prise lave-vaisselle, Raccordement taques
- **Buanderie :** Point lumineux, 1 direction, Prise double, Prise lave-linge, Prise sèche-linge
- **Salon :** Prises simples, Prises doubles, Prise triple, Prises RJ45
- **Salle à manger :** Point au plafond, 2 directions, Applique cadre, 1 direction, Prises simples
- **Garage :** Détecteur Luxomat
- **Hall des chambres 3 et 4 :** Prises simples, Interrupteur des combles
- **Salle de bains :** Éclairage au plafond, Applique du meuble / miroir, Prise double, Extracteur SILENT 100, carottage et grille
- **Chambre 1 :** Point lumineux, 1 direction
- **Chambre 2 :** Point lumineux, 1 direction
- **Chambre 3 :** Point au plafond, 3 directions, Appliques des têtes de lit

8. Photos de la visite du 29/10/2026



Photo 1 – Tableau électrique – Différentiels · constat : conforme — « Problème de disjoncteur ? »



Photo 2 – Hall d'entrée et hall cuisine – Spots au plafond · constat : conforme — « Attention prolongement »



Photo 3 – Hall d'entrée et hall cuisine – Spots au plafond · constat : conforme — « Attention prolongement »



Photo 4 – Salle de douche – Points lumineux au plafond · constat : à vérifier

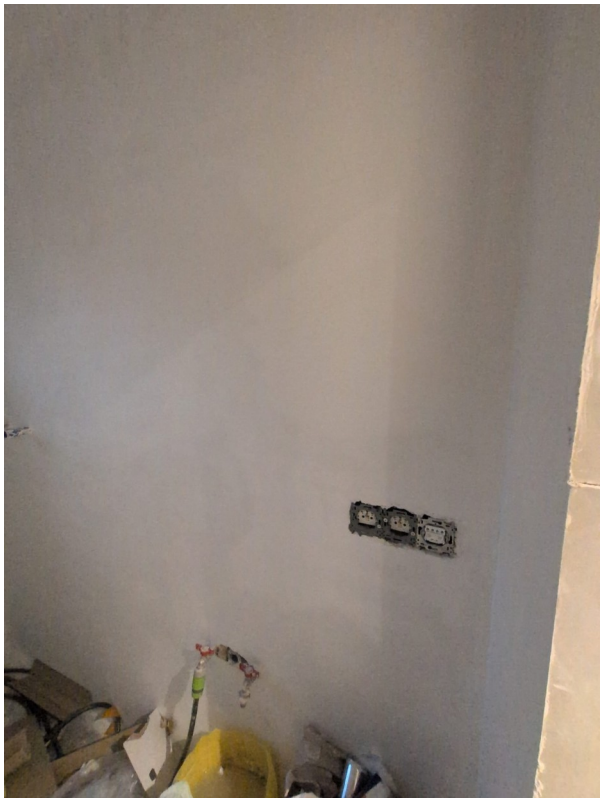


Photo 5 – Salle de douche – Point au-dessus de la douche · constat : à vérifier — « 2 prises électriques. Un interrupteur du mauvais côté ? Les prises s'activent si la lumière est allumée »



Photo 6 – Garde-manger – Spots au plafond · constat : à vérifier — « Uniquement 2 »



Photo 7 – Cuisine – Spots au plafond · constat : à vérifier — « 6 spots »



Photo 8 – Cuisine – Interrupteur des spots · constat : non conforme — « Mauvais endroit »



Photo 9 – Cuisine – Prises doubles plan de travail · constat : conforme — « Il y avait également une prise prévue ici »



Photo 10 – Buanderie – Appliques extérieures · constat : non conforme



Photo 11 – Buanderie – Prise extérieure · constat : non conforme



Photo 12 – Salle à manger – Interrupteurs près de la porte du hall · constat : conforme — « Attention erreur »



Photo 13 – Escalier et hall des chambres 1 et 2 – Éclairage au plafond · constat : non conforme — « 5 spots, comme on a toujours discuté »

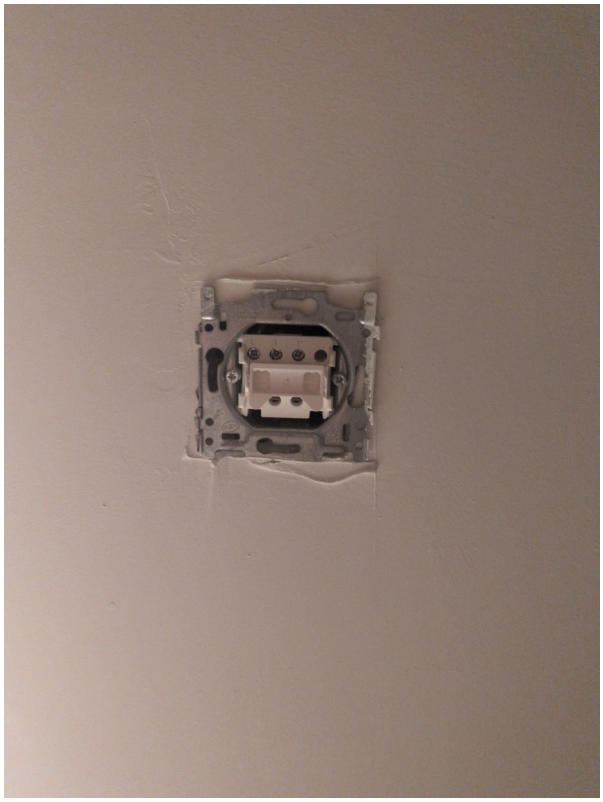


Photo 14 – Hall des chambres 3 et 4 – Point sur rail · constat : non conforme — « Quid des rails ? »
